



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388											
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر
1	پروژه تکمیل ساختمان اداری	روز ۳۴۹	1387/09/01	1388/08/20												
2	شروع پروژه	روز ۰	1387/09/01	1387/09/01												
3	تجهیز کارگاه	روز ۱۵	1387/09/01	1387/09/15												
4	اجرای نمای سنگ	روز ۱۲۲	1387/10/25	1388/02/30												
5	ضلع شمالی قسمت میانی	روز ۳۰	1387/10/25	1387/11/24												
6	ضلع شمالی سالن غذاخوری	روز ۲۱	1387/11/25	1387/12/15												
7	ضلع شمالی و شرقی نمازخانه و آمفی تئاتر	روز ۱۵	1387/11/20	1387/12/04												
8	ستونهای ضلع شمالی و شرقی نمازخانه	روز ۳۰	1388/02/01	1388/02/30												
9	نمای انضمامی سنگی	روز ۳۰	1387/12/25	1388/02/26												
10	ضلع جنوبی	روز ۳۰	1387/12/18	1388/01/22												
11	ضلع شرقی و جنوبی موتورخانه	روز ۱۱	1387/12/05	1387/12/15												
12	اجرای نمای آلومینیومی	روز ۱۹۶	1387/11/20	1388/06/05												
13	تهیه نقشه های اجرایی	روز ۳۰	1387/11/20	1387/12/19												
14	اجرای اندود پلاستر بر روی سطوح آجری نما-ضلع شمالی	روز ۳	1387/12/28	1388/01/17												
15	اجرای اندود پلاستر بر روی سطوح آجری نما-ضلع شرقی	روز ۳	1388/02/01	1388/02/03												
16	اجرای اندود پلاستر بر روی سطوح آجری نما-ضلع غربی	روز ۳	1388/02/20	1388/02/22												
17	اجرای اندود پلاستر بر روی سطوح آجری نما-ضلع جنوبی	روز ۳	1388/03/15	1388/03/17												
18	زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع شمالی	روز ۲۵	1387/12/25	1388/02/05												
19	زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع شرقی	روز ۲۰	1388/01/20	1388/02/15												
20	زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع غربی	روز ۲۶	1388/02/23	1388/03/17												
21	زیرسازی نمای آلومینیومی-ضلع جنوبی	روز ۳۱	1388/03/18	1388/04/17												
22	روسازی نمای آلومینیومی-ضلع شمالی	روز ۳۰	1388/01/05	1388/02/15												
23	روسازی نمای آلومینیومی-ضلع شرقی	روز ۲۶	1388/02/16	1388/03/10												



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388																						
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر											
24	روسازی نمای آلومینیومی-ضلع غربی	۳۰ روز	1388/03/18	1388/04/16																							
25	روسازی نمای آلومینیومی-ضلع جنوبی	۳۰ روز	1388/04/18	1388/05/16																							
26	آب بندی	۱۵ روز	1388/05/17	1388/05/31																							
27	تحويل	۵ روز	1388/06/01	1388/06/05																							
28	انجام عملیات بنایی	۲۷۴ روز	1387/09/16	1388/06/21																							
29	طبقه پنجم(بجز راه پله)	۱۹۰ روز	1387/09/16	1388/03/30																							
30	سیمانکاری دیوار و سقف اتاقهای هواساز شرقی و غربی	۱۸ روز	1387/12/03	1387/12/20																							
31	سنگ درپوش جانپناه-بامهای مجاور و نورگیرها	۵ روز	1388/02/01	1388/02/05																							
32	سیمانکاری بام	۳۰ روز	1387/12/10	1388/02/09																							
33	موزاییک کاری اتاقهای هواساز	۷ روز	1387/12/10	1387/12/16																							
34	ایزوگام	۳۰ روز	1387/09/16	1388/01/11																							
35	نصب سنگهای ازاره جانپناه بام	۵ روز	1388/01/16	1388/02/02																							
36	موزاییک کاری	۳۰ روز	1387/09/23	1388/01/12																							
37	نصب چهارچوب دربها	۶ روز	1387/11/01	1387/11/06																							
38	تهیه و نصب نورگیرهای سقفی	۳۰ روز	1388/03/01	1388/03/30																							
39	نورگیر غذاخوری	۲۰ روز	1388/03/01	1388/03/20																							
40	شاسی کشی	۱۰ روز	1388/03/01	1388/03/10																							
41	نصب شیشه و آب بندی	۱۰ روز	1388/03/11	1388/03/20																							
42	نورگیر قسمت میانی	۲۰ روز	1388/03/11	1388/03/30																							
43	شاسی کشی	۱۰ روز	1388/03/11	1388/03/20																							
44	نصب شیشه و آب بندی	۱۰ روز	1388/03/21	1388/03/30																							
45	طبقه چهارم	۱۷۴ روز	1387/10/22	1388/04/17																							
46	بخش غربی	۱۵۶ روز	1387/11/07	1388/04/14																							
47	نصب چهارچوب دربها	۵ روز	1387/11/07	1387/11/11																							

Task  Progress  Summary 
 Split  Milestone  Base Line 

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388																		
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر							
48	دیوارچینی	۵ روز	1387/11/12	1388/02/01																			
49	اجرای پاشنه بنایی محل جانپناه تراس	۵ روز	1388/01/15	1388/01/19																			
50	بتن شیب بندی تراس و پشتیبانی	۳ روز	1388/02/01	1388/02/03																			
51	ایزوگام تراس و پشتیبانی غذاخوری	۵ روز	1388/02/05	1388/02/09																			
52	گچ و خاک دیوار-غذاخوری مدیران	۱۰ روز	1387/11/17	1387/11/26																			
53	گچکاری دیوار-غذاخوری مدیران	۱۵ روز	1388/02/26	1388/03/09																			
54	اجرای سنگ قرنیز-غذاخوری	۱۵ روز	1387/12/10	1388/02/16																			
55	اجرای سنگ قرنیز-تراس	۱۰ روز	1388/02/11	1388/02/20																			
56	اجرای سنگ کف-غذاخوری	۱۴ روز	1388/02/17	1388/02/30																			
57	اجرای سنگ کف-تراس،پشتیبانی غذاخوری	۱۴ روز	1388/02/21	1388/03/03																			
58	اجرای نرده تراس	۱۰ روز	1388/02/01	1388/02/10																			
59	کاشی کاری-دیوار پشتیبانی غذاخوری	۵ روز	1388/03/05	1388/03/09																			
60	اجرای سقف کاذب-پانل گچی	۱۵ روز	1388/02/01	1388/02/15																			
61	اجرای سقف کاذب -دامپا	۲ روز	1388/04/13	1388/04/14																			
62	اجرای نازک کاری دیوار غذاخوری-پانل طرح چوب	۱۴ روز	1388/02/20	1388/03/02																			
63	نقاشی دیوار	۷ روز	1388/03/10	1388/03/16																			
64	نقاشی سقف	۱۴ روز	1388/03/22	1388/04/04																			
65	بخش میانی	۱۷۴ روز	1387/10/22	1388/04/17																			
66	برچیدن کف سرویسیها	۷ روز	1387/10/22	1387/10/28																			
67	برچیدن کاشی دیوار سرویسیها	۳ روز	1387/12/25	1387/12/27																			
68	ایزوگام سرویسیها	۴ روز	1387/12/09	1387/12/12																			
69	سیمانکاری سرویسیها	۸ روز	1387/12/13	1387/12/20																			
70	کاشی و سرامیک کاری-سرویسیها	۱۶ روز	1387/12/14	1388/02/04																			



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388																				
					مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان									
71	تکمیل سنگ کاری بدنه و ستونها	۱۰ روز	1388/02/26	1388/03/04																					
72	سنگ درپوش جانپناه وید میانی	۱۰ روز	1388/03/01	1388/03/10																					
73	گچکاری-اتاق اینترنت	۴ روز	1388/02/16	1388/02/19																					
74	سقف کاذب-پانل گچی	۱۴ روز	1388/02/16	1388/02/29																					
75	اجرای سقف کاذب-دامپا	۵ روز	1388/04/13	1388/04/17																					
76	نقاشی سقف و دیوار	۱۵ روز	1388/04/01	1388/04/15																					
77	طبقه سوم	۱۸۴ روز	1387/10/29	1388/05/03																					
78	بخش غربی	۱۵۴ روز	1387/11/22	1388/04/27																					
79	نصب چهارچوب دربها	۵ روز	1387/12/12	1387/12/16																					
80	دیوارچینی	۱۰ روز	1387/11/22	1387/12/01																					
81	اجرای پاشنه بنایی محل جانپناه تراس	۵ روز	1388/01/20	1388/01/24																					
82	بتن شیب بندی فضای پشتیبانی	۲ روز	1388/01/23	1388/01/24																					
83	ایزوگام تراس و پشتیبانی غذاخوری	۵ روز	1388/02/21	1388/02/25																					
84	گچ و خاک دیوار-غذاخوری	۱۰ روز	1387/12/07	1387/12/16																					
85	گچکاری دیوار-غذاخوری	۱۰ روز	1388/03/20	1388/03/29																					
86	اجرای سنگ قرنیز-غذاخوری	۱۰ روز	1388/02/31	1388/03/09																					
87	اجرای سنگ قرنیز-تراس	۱۰ روز	1388/03/10	1388/03/19																					
88	اجرای سنگ کف-غذاخوری	۱۴ روز	1388/03/10	1388/03/23																					
89	اجرای سنگ کف-تراس،پشتیبانی غذاخوری	۱۴ روز	1388/03/20	1388/04/02																					
90	اجرای نرده تراس	۱۰ روز	1388/02/11	1388/02/20																					
91	کاشی کاری-دیوار پشتیبانی غذاخوری	۵ روز	1388/02/26	1388/02/30																					
92	اجرای سقف کاذب-پانل گچی	۱۵ روز	1388/02/16	1388/02/30																					
93	اجرای سقف کاذب-دامپا	۲ روز	1388/04/13	1388/04/14																					
94	اجرای نازک کاری دیوار غذاخوری-پانل طرح چوب	۱۴ روز	1388/03/30	1388/04/12																					


Task  Progress  Summary 
Split  Milestone  Base Line

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388												
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	
95	نقاشی دیوار	۷ روز	1388/04/06	1388/04/12													
96	نقاشی سقف	۱۵ روز	1388/04/13	1388/04/27													
97	بخش میانی	۱۸۴ روز	1387/10/29	1388/05/03													
98	برچیدن کف سرویسهها	۷ روز	1387/10/29	1387/11/05													
99	برچیدن کاشی دیوار سرویسهها	۳ روز	1387/12/28	1387/12/30													
100	ایزوگام سرویسهها	۴ روز	1387/12/13	1388/02/02													
101	سیمانکاری سرویسهها	۸ روز	1388/01/16	1388/02/10													
102	کاشی و سرامیک کاری-سرویسهها	۲۰ روز	1388/01/24	1388/02/24													
103	گچ و خاک دیوار-مطالعه روزنامه و کتابخانه	۵ روز	1387/12/17	1387/12/21													
104	گچکاری دیوار-مطالعه روزنامه و کتابخانه	۵ روز	1388/03/30	1388/04/03													
105	تکمیل سنگ کاری کف-کتابخانه	۴ روز	1388/03/24	1388/03/27													
106	تکمیل سنگ کاری دیوار و ستونها-لابی	۱۰ روز	1388/03/28	1388/04/06													
107	سنگ درپوش جانپناه وید میانی	۱۰ روز	1388/03/11	1388/03/20													
108	اجرای سقف کاذب-دامپا	۵ روز	1388/04/18	1388/04/22													
109	اجرای سقف کاذب-MDF	۱۰ روز	1388/04/04	1388/04/13													
110	سقف کاذب-پانل گچی	۱۴ روز	1388/04/07	1388/04/20													
111	نقاشی دیوار و سقف	۱۵ روز	1388/04/20	1388/05/03													
112	طبقه دوم	۱۹۷ روز	1387/11/01	1388/05/18													
113	بخش غربی	۱۹۷ روز	1387/11/01	1388/05/18													
114	نصب چهارچوب دربها	۵ روز	1387/12/17	1387/12/21													
115	دیوارچینی	۸ روز	1387/11/01	1387/12/06													
116	بتن شیب بندی فضای پشتیبانی	۲ روز	1388/01/25	1388/01/26													
117	ایزوگام پشتیبانی غذاخوری	۲ روز	1388/02/05	1388/02/06													
118	گچ و خاک دیوار-غذاخوری	۱۰ روز	1387/12/13	1387/12/22													



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388													
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر		
119	گچکاری دیوار-غذاخوری	۱۰ روز	1388/03/30	1388/04/08														
120	اجرای سنگ قرنیز-غذاخوری	۱۰ روز	1387/12/10	1388/03/27														
121	اجرای سنگ کف-غذاخوری و پشتیبانی غذاخوری	۱۴ روز	1388/03/28	1388/04/10														
122	کاشی کاری-دیوار پشتیبانی غذاخوری	۵ روز	1388/04/11	1388/04/15														
123	اجرای سقف کاذب-پانل گچی	۱۵ روز	1388/02/31	1388/03/14														
124	اجرای سقف کاذب-دامپا	۲ روز	1388/04/15	1388/04/16														
125	اجرای نازک کاری دیوار غذاخوری-پانل طرح چوب	۱۴ روز	1388/04/13	1388/04/26														
126	نقاشی دیوار	۱۰ روز	1388/04/25	1388/05/03														
127	نقاشی سقف	۱۵ روز	1388/05/04	1388/05/18														
128	بخش میانی	۱۸۲ روز	1387/11/06	1388/05/08														
129	برچیدن کف سرویسهها	۷ روز	1387/11/06	1387/11/12														
130	برچیدن کاشی دیوار سرویسهها	۳ روز	1388/01/05	1388/01/07														
131	ایزوگام سرویسهها	۴ روز	1388/01/16	1388/02/04														
132	سیمانکاری سرویسهها	۴ روز	1388/01/20	1388/02/06														
133	کاشی و سرامیک کاری-سرویسهها	۲۰ روز	1388/01/24	1388/02/24														
134	گچ و خاک دیوار	۵ روز	1387/12/10	1387/12/14														
135	گچکاری دیوار	۸ روز	1388/04/09	1388/04/16														
136	تکمیل سنگ کاری کف	۴ روز	1388/04/11	1388/04/14														
137	سنگ کاری دیوار و ستونهای-لابی	۲ روز	1388/04/15	1388/04/16														
138	اجرای سقف کاذب-دامپا	۵ روز	1388/04/23	1388/04/27														
139	اجرای سقف کاذب-MDF	۱۰ روز	1388/04/17	1388/04/26														
140	سقف کاذب-پانل گچی	۱۴ روز	1388/04/21	1388/05/03														
141	نقاشی دیوار و سقف	۱۵ روز	1388/04/25	1388/05/08														
142	طبقه اول	۲۳۱ روز	1387/11/01	1388/06/21														

Task		Progress		Summary	
Split		Milestone		Base Line	

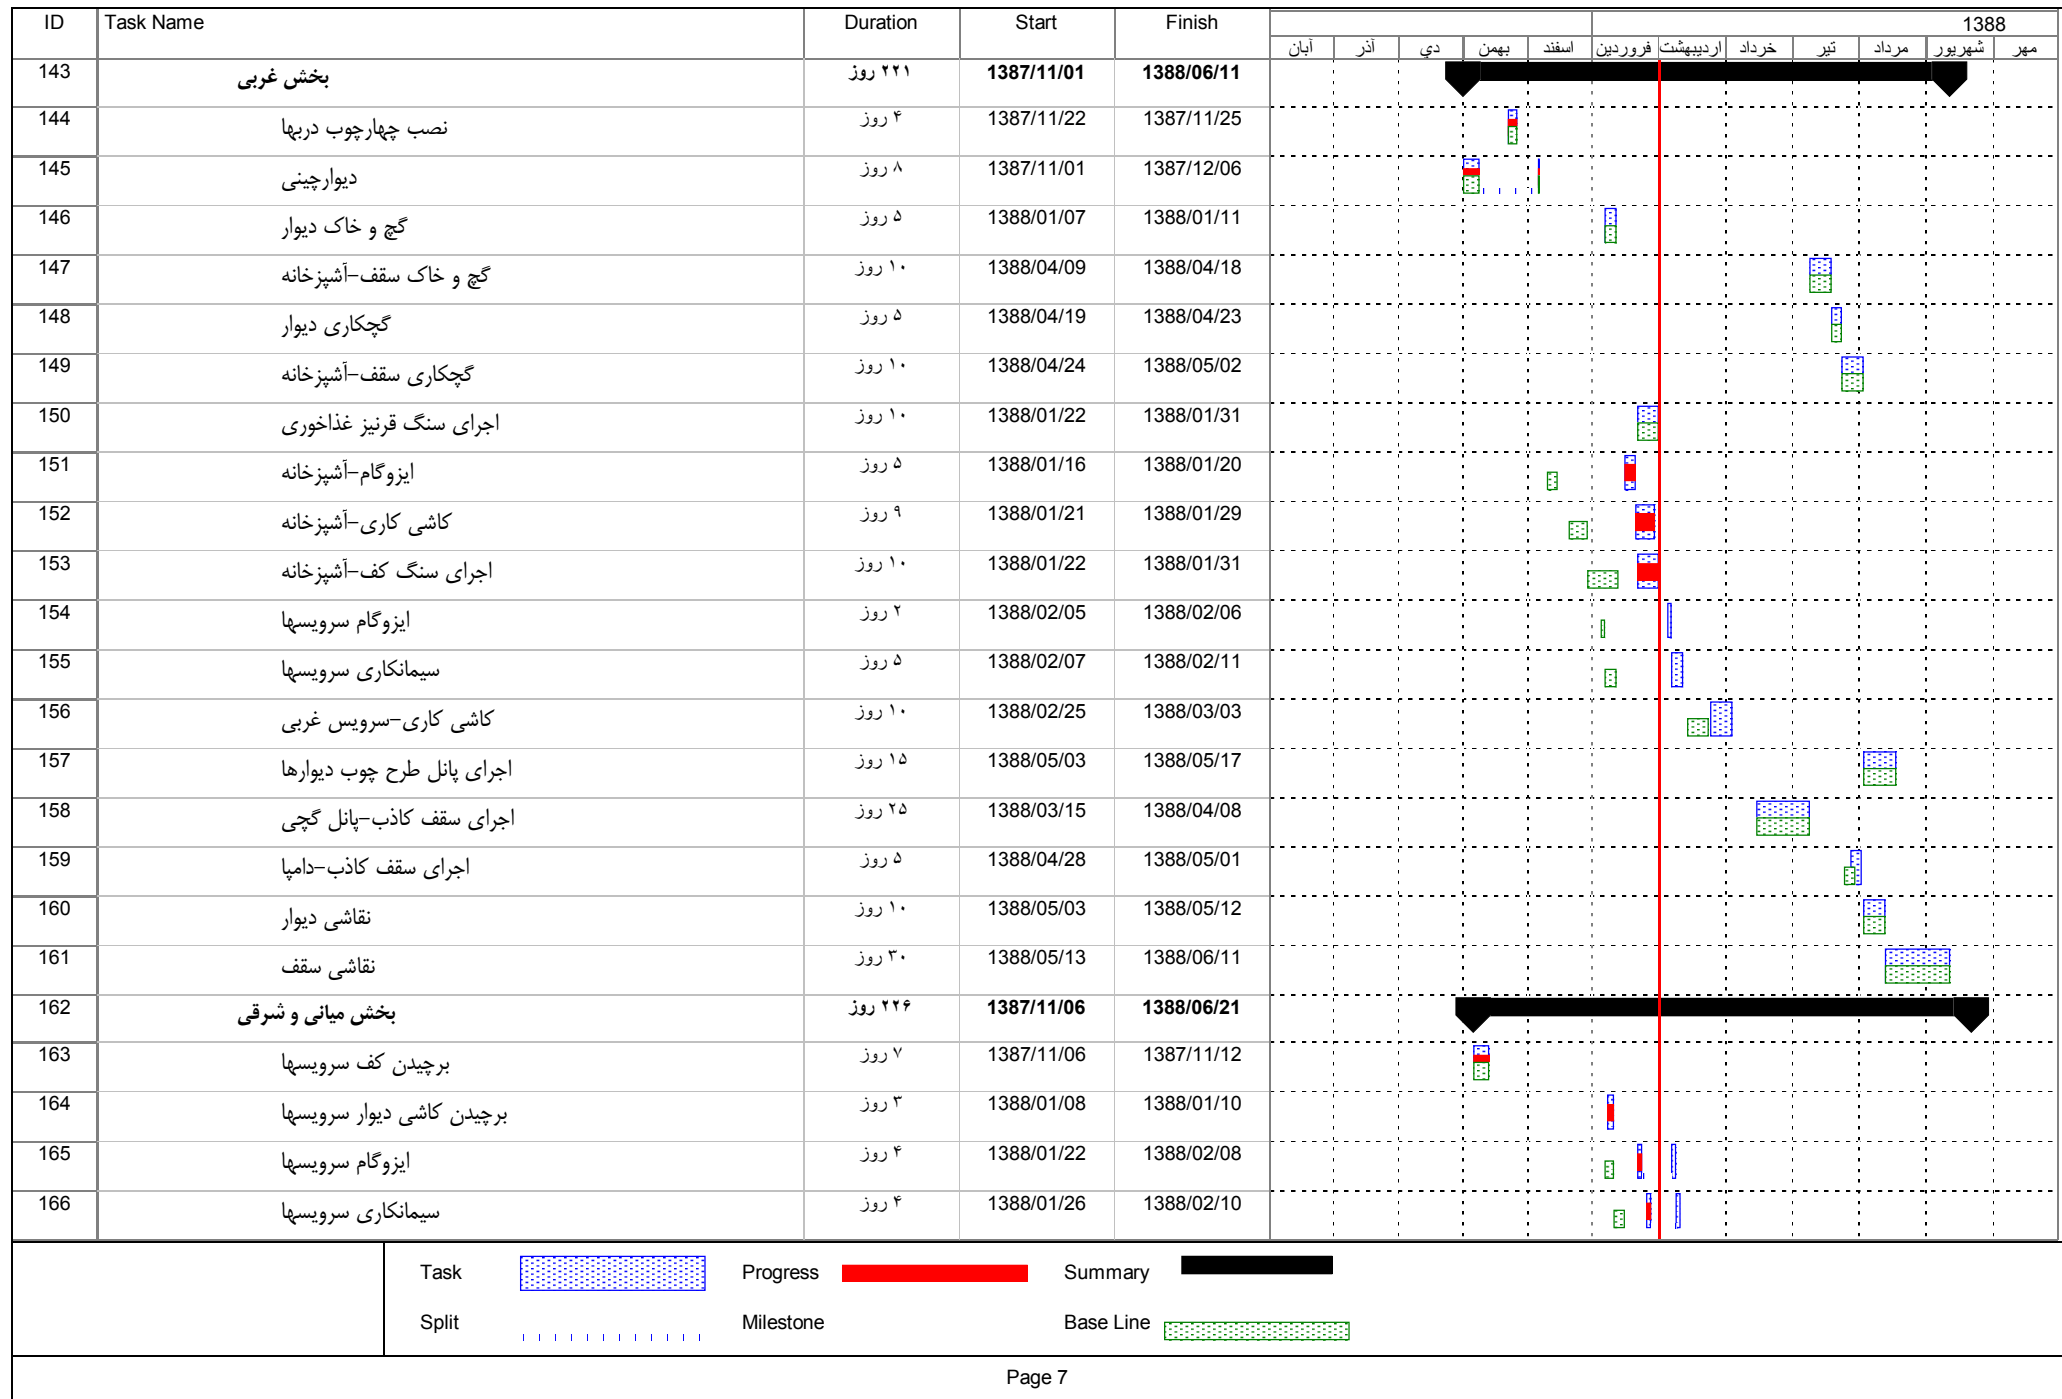

Task		Progress		Summary	
Split		Milestone		Base Line	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388																		
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر							
167	کاشی و سرامیک کاری-سرویسها	۲۰ روز	1388/03/04	1388/03/23																			
168	گچ و خاک دیوار	۵ روز	1387/12/15	1388/02/02																			
169	گچ و خاک سقف	۱۰ روز	1388/05/03	1388/05/12																			
170	گچکاری دیوار	۵ روز	1388/05/13	1388/05/17																			
171	گچکاری سقف	۱۰ روز	1388/05/18	1388/05/27																			
172	اجرای سقف کاذب-دامپا	۵ روز	1388/05/02	1388/05/06																			
173	اجرای سقف کاذب-پانل گچی	۲۵ روز	1388/04/09	1388/05/02																			
174	نقاشی دیوار	۱۲ روز	1388/05/28	1388/06/08																			
175	نقاشی سقف	۲۰ روز	1388/06/02	1388/06/21																			
176	طبقه همکف	۲۰۶ روز	1387/11/01	1388/05/27																			
177	بخش غربی	۱۸۵ روز	1387/11/22	1388/05/27																			
178	نصب چهارچوب دربها	۱۴ روز	1387/11/22	1387/12/05																			
179	گچ و خاک دیوار-غذاخوری	۵ روز	1388/01/12	1388/01/17																			
180	گچکاری دیوار-غذاخوری	۵ روز	1388/04/24	1388/04/28																			
181	اجرای سنگ قرنیز-غذاخوری	۵ روز	1388/04/11	1388/04/15																			
182	اجرای سنگ کف-غذاخوری	۱۴ روز	1388/04/16	1388/04/29																			
183	اجرای سقف کاذب-پانل گچی	۱۵ روز	1388/05/03	1388/05/17																			
184	نقاشی دیوار	۱۰ روز	1388/04/29	1388/05/07																			
185	نقاشی سقف	۲۰ روز	1388/05/08	1388/05/27																			
186	بخش میانی	۱۹۰ روز	1387/11/01	1388/05/11																			
187	برچیدن کف سرویسها	۷ روز	1387/11/06	1387/11/12																			
188	برچیدن کاشی دیوار سرویسها	۳ روز	1388/02/01	1388/02/03																			
189	دیوارچینی	۱۰ روز	1387/11/01	1387/11/10																			
190	ایزوگام سرویسها	۴ روز	1388/02/09	1388/02/12																			

Task  Progress  Summary 

Split  Milestone  Base Line 

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388																		
					مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان							
191	سیمانکاری سرویسها	۴ روز	1388/02/13	1388/02/16																			
192	کاشی و سرامیک کاری-سرویسها	۲۰ روز	1388/03/24	1388/04/12																			
193	اجرای سقف کاذب-دامپا	۵ روز	1388/05/07	1388/05/11																			
194	راه پله و پاگرد	۱۵۹ روز	1387/12/01	1388/05/10																			
195	اجرای سنگ پله راه پله اصلی	۲۰ روز	1387/12/01	1387/12/20																			
196	اجرای سنگ پله راه پله میانی به غذاخوری	۱۵ روز	1387/12/21	1388/01/09																			
197	تکمیل سنگ پله راه پله قسمت میانی	۲۰ روز	1387/12/25	1388/01/31																			
198	اجرای سنگ پله راه پله میانی به آمفی تئاتر و جنوبی	۱۵ روز	1387/12/25	1388/01/14																			
199	اجرای گچ و خاک و گچکاری راه پله اصلی	۲۰ روز	1387/12/25	1388/02/10																			
200	اجرای گچ و خاک و گچکاری راه پله میانی به غذاخوری	۱۰ روز	1388/01/26	1388/02/15																			
201	اجرا گچ و خاک و گچکاری راه پله قسمت میانی	۲۰ روز	1388/02/16	1388/03/04																			
202	اجرای گچ و خاک و گچکاری راه پله میانی به آمفی تئاتر و جنوبی	۱۰ روز	1387/12/28	1388/02/20																			
203	تکمیل سنگ کاری دیوار	۲۰ روز	1387/12/20	1388/01/29																			
204	نقاشی دیوار	۲۰ روز	1388/02/21	1388/03/09																			
205	نقاشی سقف	۲۱ روز	1388/02/31	1388/03/20																			
206	اجرای سقف کاذب پانل گچی	۱۵ روز	1388/04/27	1388/05/10																			
207	اجرای راه پله میانی غذاخوری(منوط به مشخص شدن طرح)	۳۰ روز	1388/02/05	1388/03/03																			
208	تخریب راه پله موجود	۵ روز	1388/02/05	1388/02/09																			
209	اجرای مجدد راه پله(منوط به مشخص شدن طرح)	۲۵ روز	1388/02/10	1388/03/03																			
210	حفر چاه جذبی	۲۰ روز	1388/03/12	1388/04/01																			
211	تهیه و نصب نرده قسمت وید میانی	۲۰ روز	1387/12/06	1388/02/12																			
212	تهیه و نصب نرده قسمت راه پله اصلی	۲۰ روز	1387/12/10	1387/12/29																			
213	تهیه و نصب نرده راه پله میانی	۳۳ روز	1388/01/16	1388/02/17																			
214	ساخت و نصب فریم n ضلعی	۵۵ روز	1387/12/01	1388/02/11																			



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388												
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	
215	تهیه و نصب درب چوبی	۴۵ روز	1388/04/15	1388/05/28													
216	تهیه و نصب دربه‌های آلومینیومی	۶۰ روز	1388/03/24	1388/05/21													
217	تهیه و نصب دربه‌های آهنی	۳۰ روز	1387/12/01	1388/02/03													
218	تهیه و نصب درب سردخانه	۲۰ روز	1388/05/13	1388/06/01													
219	تهیه و نصب دربه‌های اتوماتیک	۳۰ روز	1388/05/01	1388/05/30													
220	تهیه، نصب و رگلاژ پنجره‌ها	۱۲۰ روز	1388/02/15	1388/06/10													
221	تهیه و نصب شیشه‌ها	۶۰ روز	1388/04/22	1388/06/19													
222	تهیه و نصب یراق آلات	۱۵ روز	1388/05/29	1388/06/12													
223	نقاشی کلیه کارهای فلزی	۳۰ روز	1388/05/15	1388/06/13													
224	نقاشی کلیه کارهای چوبی	۳۰ روز	1388/05/20	1388/06/18													
225	پوشش درزهای انقطاع	۴۰ روز	1388/05/10	1388/06/18													
226	تاسیسات برقی	۲۵۵ روز	1387/09/16	1388/06/02													
227	تست و شناسایی تاسیسات برقی	۳۰ روز	1387/09/16	1387/10/15													
228	کابلکشی	۸۰ روز	1387/10/16	1388/02/16													
229	لوله کشی برق	۵۰ روز	1387/10/16	1387/12/07													
230	سیم کشی برق و ارت	۱۰۰ روز	1387/11/08	1388/02/30													
231	لوله کشی دوربین مداربسته	۱۵ روز	1387/12/15	1388/02/12													
232	سیم کشی دوربین مداربسته	۲۰ روز	1388/01/10	1388/02/28													
233	داکت کشی و کابل کشی شبکه	۵۰ روز	1387/12/10	1388/03/09													
234	تهیه و نصب تابلوها	۶۰ روز	1387/12/01	1388/03/14													
235	کابل‌های تلفن	۳۰ روز	1387/10/28	1388/02/18													
236	نصب چراغ، دکتور، بلندگو	۴۰ روز	1388/04/25	1388/06/02													
237	نصب کلید و پریز	۲۰ روز	1388/05/14	1388/06/02													



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1388											
					آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر
238	تاسیسات مکانیکی	۲۶۷ روز	1387/09/16	1388/06/14												
239	تست و شناسایی تاسیسات مکانیکی	۳۰ روز	1387/09/16	1387/10/15												
240	تکمیل لوله کشی فاضلاب	۵۶ روز	1387/10/16	1388/02/17												
241	تعمیر و جابجایی هواساز غربی	۱۰ روز	1387/12/25	1388/02/02												
242	تعمیر و جابجایی هواساز شرقی	۱۰ روز	1388/01/09	1388/02/04												
243	کانال کشی	۴۵ روز	1387/12/01	1388/02/30												
244	لوله کشی آب و نصب تجهیزات سرویسهای بهداشتی	۶۰ روز	1387/12/03	1388/02/22												
245	نصب کولر، فن کوئل، هواکش، آب سرد کن	۳۰ روز	1388/02/23	1388/03/21												
246	نصب شیرآلات سرویسها و آشپزخانه	۴۰ روز	1388/04/25	1388/06/02												
247	تهیه و نصب کابینت و سایر تجهیزات آشپزخانه	۳۰ روز	1388/04/25	1388/05/23												
248	تکمیل و راه اندازی سردخانه ها	۳۰ روز	1388/05/16	1388/06/14												
249	محوطه سازی	۲۳۱ روز	1387/12/21	1388/08/10												
543	برچیدن کارگاه	۱۰ روز	1388/08/11	1388/08/20												
544	پایان پروژه	۰ روز	1388/08/20	1388/08/20												

Task		Progress		Summary	
Split		Milestone		Base Line	
